



---

# ZEB Prøvedrift


---

25.1..21

Roar Alstad, Veidekke

---

# NS6450 Prøvedrift

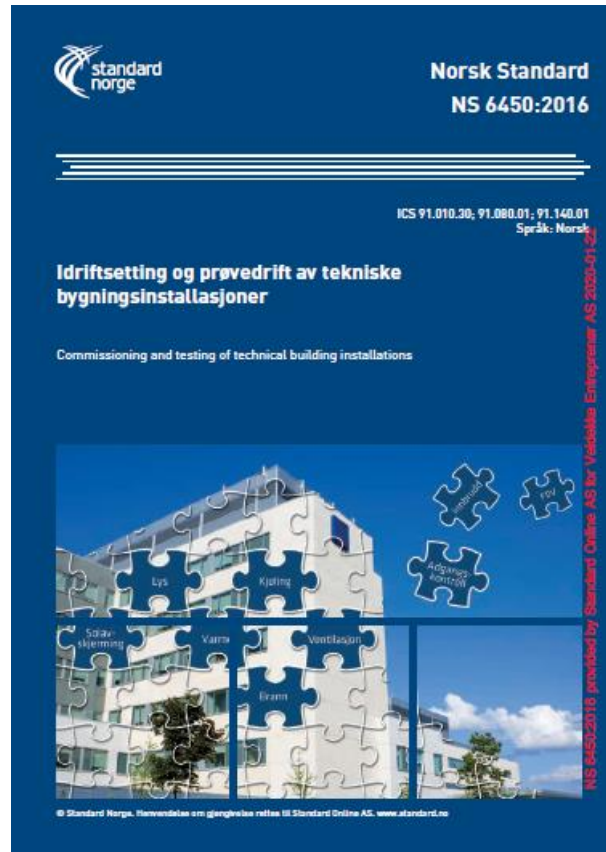

## 4.6 Prøvedriftsfasen


I prøvedriftsfasen skal det bekreftes at kontraktens spesifikasjonskrav til ytelse, kvalitet, funksjonalitet, kapasitet og stabilitet i de tekniske bygningsinstallasjonene oppfylles i en gitt tidsperiode (prøvedriftsfasens lengde) med brukere i bygget (internlast) og med ytre klimatiske påvirkninger.

Prøvedriftsfasen skal også benyttes til å optimalisere systemene og overføre kompetanse til driftspersonellet. Prøvedrift av de tekniske bygningsinstallasjonene starter etter innflytting. Prøvedriften kan utføres for alle systemer samlet, eller deles opp, avhengig av installasjonstype og behovet for prøvedrift (prøvedrift for systemtype A, B osv).

Det skal gjennomføres evakueringsøvelse i prøvedriftsfasen, se også 3.14.




Ordinær drift starter etter at prøvedrift på det siste systemet er avsluttet, se figur 2.

# NS6450 Prøvedrift

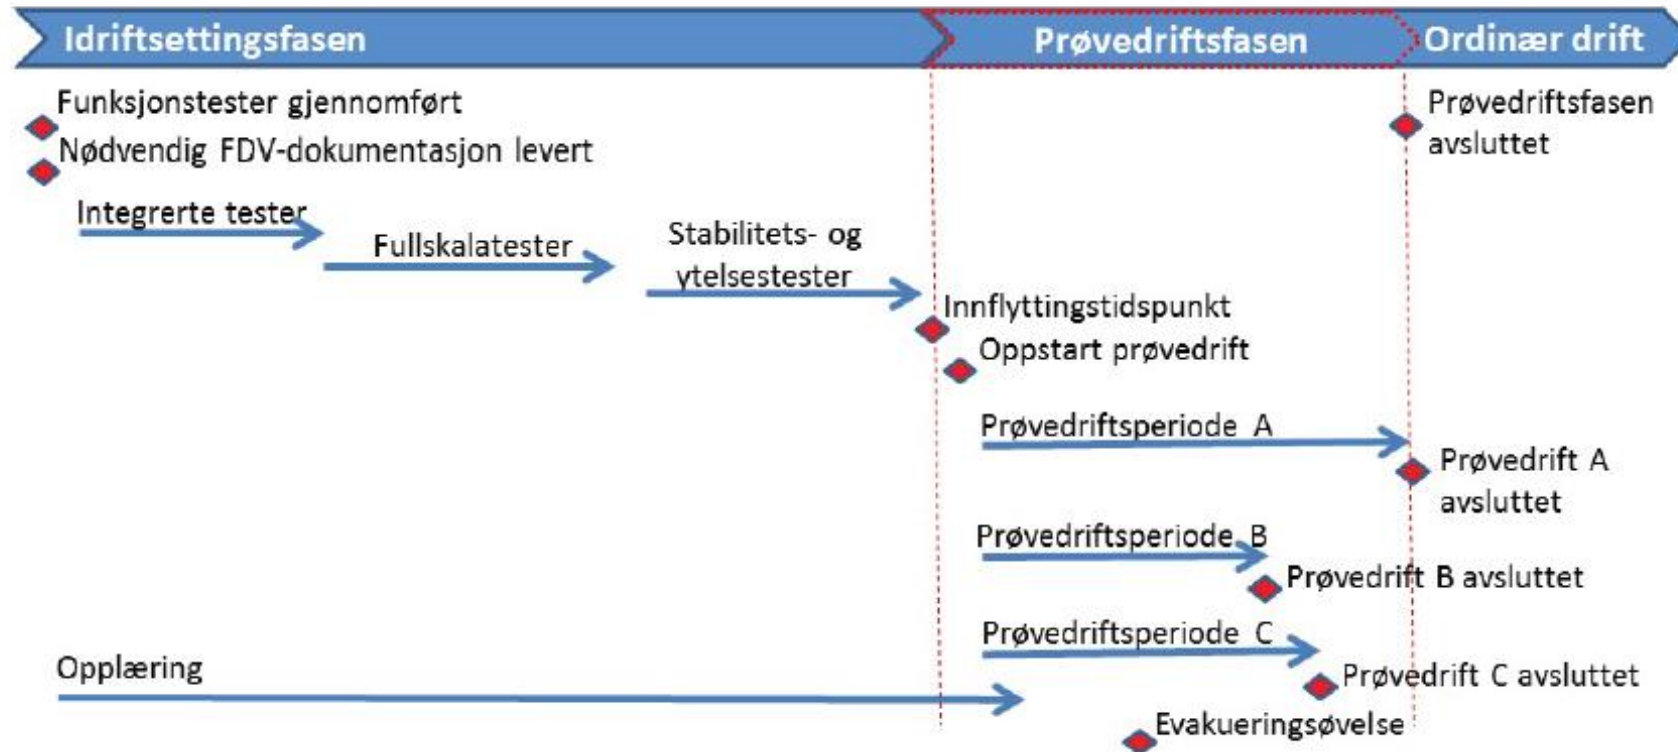

Figur 2 – Idriftsettingsfase, prøvedriftsfase og overgang til ordinær drift

# Veidekkes Prøvedrift

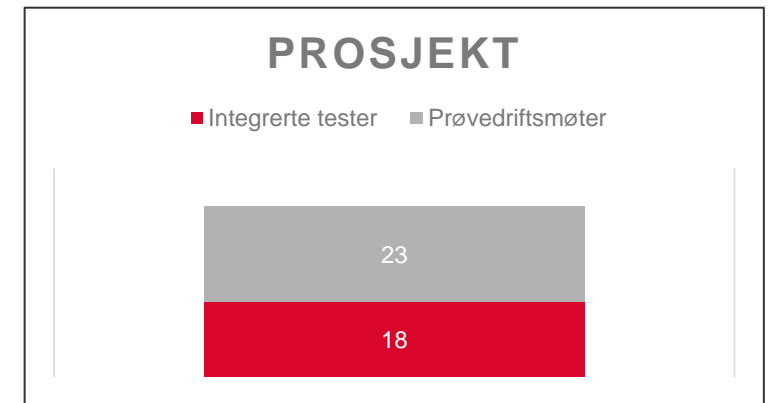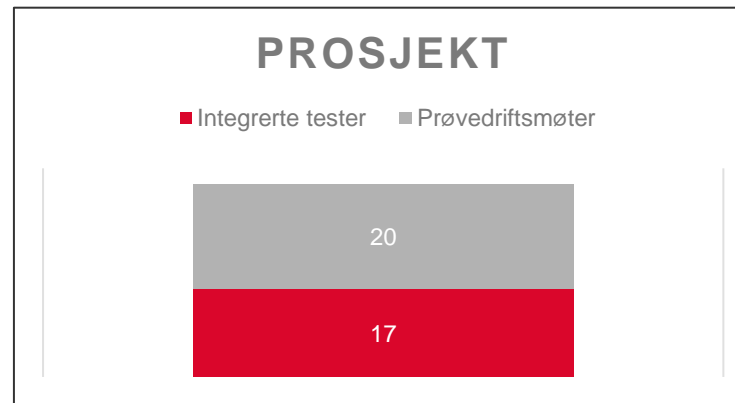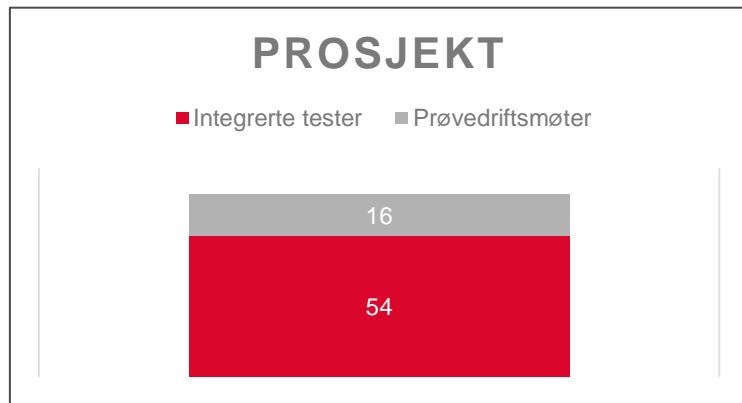

- Table tester
- Systemtester



Involverende planlegging

# ZEB FL - Prøvedrift

ZEB-FL – Høyskoleringen 13  
Notat gjennomføring Prøvedrift  
Gunnar Lien, 30.08.2021



## Innhold

1	INNLEDNING .....	2
2	FORUTSETNINGER I PROSJEKTET .....	2
3	DELTAKERE I PRØVEDRIFTSPERIODEN.....	2
4	FORUTSETNINGER FOR OPPSTART PRØVEDRIFT .....	2
5	ANSVAR I PRØVEDRIFTSPERIODEN.....	3
6	GJENNOMFØRING .....	3
6.1	Prøvedriftsmøter.....	3
6.2	Agenda prøvedriftsmøter.....	3
7	AKTIVITETER.....	4
8	AVSLUTNING AV PRØVEDRIFTSFASEN .....	4

## 6 Gjennomføring

### 6.1 Prøvedriftsmøter

Aktivitet	Ansvarlig	Frekvens/Periode
<b>Oppstartsmøte</b> Gjennomgang av plan, oppgaver og ansvar i prøvedriftsperioden	Veidekke kaller inn og leder møtet Byggherre og alle tekniske UE deltar	2 uker etter overlevering.
<b>Prøvedriftsmøter (NS 6450)</b> Agenda angitt under	Veidekke kaller inn og leder møter Byggherre og alle tekniske UE deltar	Annenhver uke de 2 første måneder. Hver 4. uke 2-4 første måneder. Deretter annenhver måned.
<b>Oppfølgingsmøter (NS 6450)</b> Særmøter for oppfølging av saker fra prøvedriftsmøter	Veidekke kaller inn og leder møter Ansvarlig UE deltar. Byggherre deltar ved behov/ønske.	Etter behov, og da i etterkant av hvert prøvedriftsmøte. Frekvens ut fra sakens prioritet.
<b>Systemgjennomgang</b> Særmøter for gjennomgang av systemer ihht. plan i årshjul.	Veidekke kaller inn og leder møter Byggherre og alle tekniske UE deltar (evt. UE etter behov)	Tilpasses aktiviteter i årshjul, i utgangspunktet hvert kvartal.





Takk for  
**oppmerksomheten**

